

ご近隣の皆様へ

6月15日

## 既設管撤去工事のお知らせ

4月から行っている水道工事に対しまして、ご理解・ご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

今後の工事予定をお知らせします。

工事にあたっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、通行規制などでご迷惑をお掛けする場合も御座いますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い致します。

なお、工事施工箇所は安全第一を考慮し**車両通行止め（二輪車含む）**にて行いますので迂回のご協力をお願いします。（自転車・歩行者の方は通行可能です）

6月からは使用しなくなる配水管の撤去を行います。また、お客様の敷地前や出入口に関しては、敷き鉄板等を用意して通行を可能にしますが少しお時間をいただく場合がありますので、時間に余裕をもって作業員にお声がけして頂ければ幸いです。

本工事も終盤に近付いてまいりました!!


次工程は、舗装復旧工事になります。

引き続き、ご理解ご協力の程宜しく申し上げます。

工事名：企津第26号 相模原市緑区川尻4117番地付近  
配水管改良工事（概数設計）

工事期間：令和6年3月25日から令和6年10月1日まで

施工業者：日本プランニング株式会社 042-782-2057  
現場代理人 内藤 厚 080-5375-8794

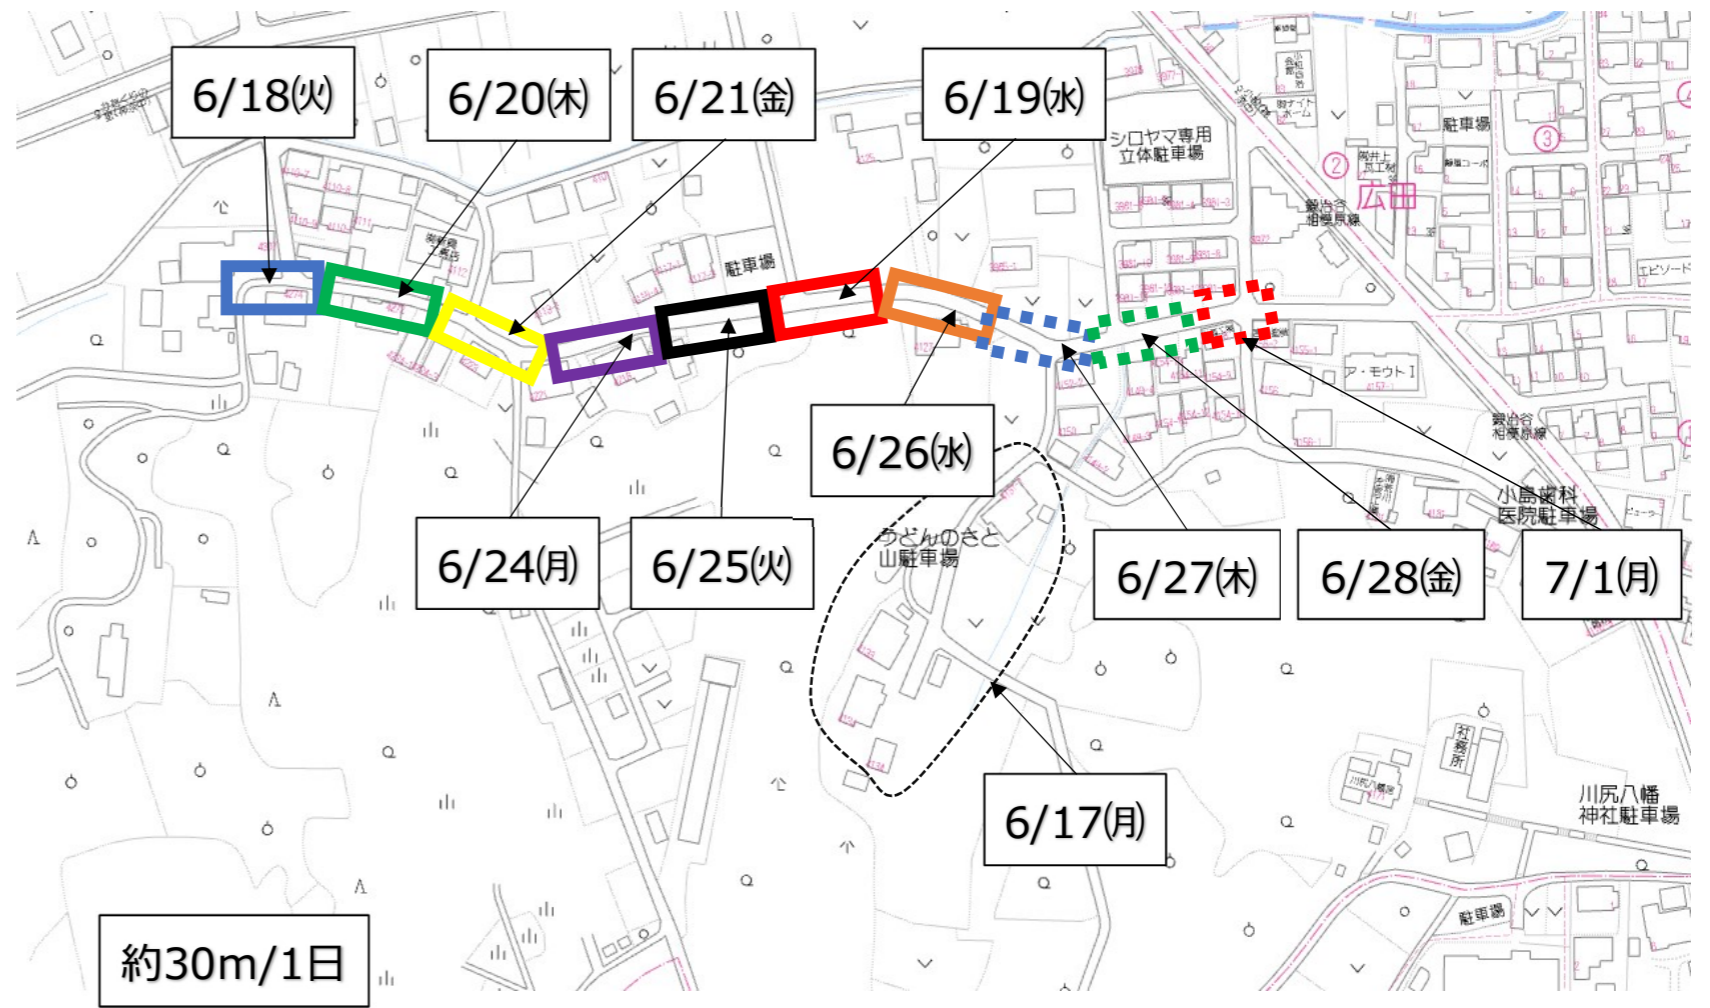

6月16日から7月5日までの予定

日	月	火	水	木	金	土
16	17	18	19	20	21	22
休工	給水管付替工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	休工
23	24	25	26	27	28	29
休工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	休工
30	7月1日	2	3	4	5	6
休工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	管撤去工	休工
7	8	9	10	11	12	13
休工		予備日	予備日	予備日	予備日	休工

- ※工事時間は昼間工事の9時から17時
- ※雨天・荒天の場合は延期が予想されます
- ※工事の進捗により施工量が前後することも予想されます
- ※工事情報は適時更新していきます
